

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°007-25 SU19

CLIENTE : HERCO CONSTRUCTORES SRL

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : AV. LA LIBERTAD NRO. 614 URB. SANTA VICTORIA (A TRES CUADRAS DEL OVALO
STA. VICTORIA) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

RECEPCIÓN N° : 072- 25

PROYECTO ** : PAVIMENTACIÓN DE LA ETAPA IV DE CAPILLUCAS

FECHA EMISIÓN: : 2025-01-27

UBICACIÓN ** : LOCALIDAD DE CAPILLUCAS, DISTRITO DE ALLAUCA, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SONDAJE ** : CANtera: Zuñiga - Buenos Aires

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 022-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-18

TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-20

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	11	11	89
3/8 in (9.5 mm)	21	32	68
No. 4 (4.75 mm)	17	48	52
Menor (No. 4)	52	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,75	2,75	2,75	2,75
contenido de agua saturación (%)	8,4	7,8	7,1	8,4

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°008-25 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,283	2,346	2,443	2,410

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2,2	3,7	6,2	8,0
Densidad Seca (g/cm³)	2,234	2,263	2,301	2,232
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21,91	22,19	22,56	21,89

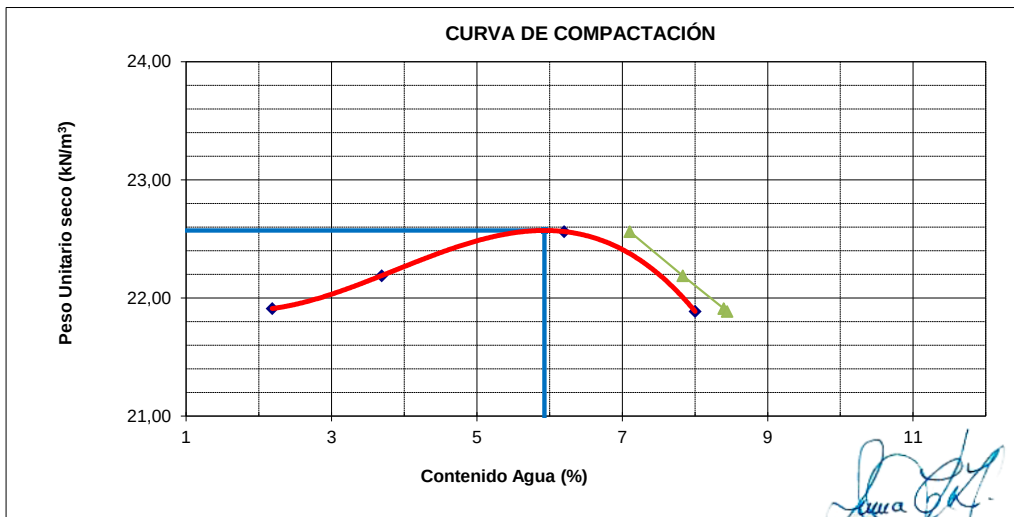

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

22,58 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

5,9 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°007-25 SU19

CLIENTE : HERCO CONSTRUCTORES SRL

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : AV. LA LIBERTAD NRO. 614 URB. SANTA VICTORIA (A TRES CUADRAS DEL OVALO
STA. VICTORIA) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

RECEPCIÓN N° : 072- 25

PROYECTO ** : PAVIMENTACIÓN DE LA ETAPA IV DE CAPILLUCAS

FECHA EMISIÓN: : 2025-01-27

UBICACIÓN ** : LOCALIDAD DE CAPILLUCAS, DISTRITO DE ALLAUCA, PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
2
SUB REDONDEADA

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 05-25 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

