

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°009-25 SU19

CLIENTE : GOLDEN TOWER CONSTRUCTION
DIRECCIÓN ** : CALIGNACIO MERINO NRO. 160 URB. SIMA PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV.
CONST. DEL CALLAO - LA PERLA
PROYECTO ** : AMPLIACION DE TECHO EN NUEVA SALA MANTEQUILLA
UBICACIÓN ** : AV. LA CAPITANA 190 (PLANTA GLORIA - SEDE HUACHIPA)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 096- 25

FECHA EMISIÓN: : 27-01-25

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : MATERIAL PROPIO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 168-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 27-01-25

FECHA DE EJECUCIÓN : 28-01-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	0	0	100
3/8 in (9.5 mm)	0	0	100
No. 4 (4.75 mm)	0	0	100
Menor (No. 4)	100	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,76	2,76	2,76	2,76
contenido de agua saturación (%)	16,7	14,6	14,8	16,8

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°000-24 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	25	25	25	25
Densidad húmeda (g/cm³)	2,061	2,186	2,211	2,166

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	9,1	11,1	12,9	14,8
Densidad Seca (g/cm³)	1,889	1,968	1,959	1,887
Peso unitario seco del suelo kN/m³	18,52	19,30	19,21	18,51

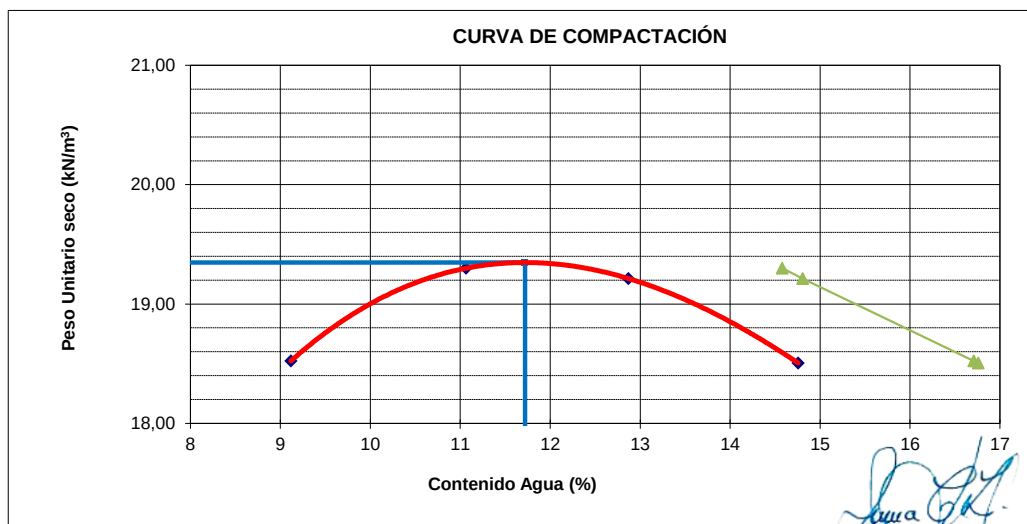

Método de Ensayo

A

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

19,87 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

11,7 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°009-25 SU19

CLIENTE : GOLDEN TOWER CONSTRUCTION
DIRECCIÓN ** : CALIGNACIO MERINO NRO. 160 URB. SIMA PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV.
CONST. DEL CALLAO - LA PERLA
PROYECTO ** : AMPLIACION DE TECHO EN NUEVA SALA MANTEQUILLA
UBICACIÓN ** : AV. LA CAPITANA 190 (PLANTA GLORIA - SEDE HUACHIPA)
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 096- 25

FECHA EMISIÓN: : 27-01-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
No.4
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
No.4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

